



---

## Dichiarazione degli impegni

---

**Gruppo Coderius**

[coderius01@gmail.com](mailto:coderius01@gmail.com)

Tabella di versionamento

| Versione | Data       | Autore      | Verificatore        | Descrizione                                               |
|----------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 0.1.2    | 2026/03/22 | Edis Hodja  | Filippo Zonta Rocha | Integrazione della sezione scadenze e rischi del progetto |
| 0.1.1    | 2026/03/21 | Edis Hodja  | Filippo Zonta Rocha | Analisi impegni orari e distribuzione dei ruoli           |
| 0.1.0    | 2026/03/20 | Ines Iadadi | Filippo Zonta Rocha | Stesura iniziale del documento                            |

# Indice

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 1. Introduzione .....                          | 1 |
| 2. Impegno orario e preventivo dei costi ..... | 1 |
| 3. Partizione dei ruoli .....                  | 2 |
| 3.1. Descrizione dei ruoli .....               | 2 |
| 3.2. Distribuzione dei ruoli .....             | 3 |
| 4. Termine del Progetto .....                  | 4 |
| 4.1. Rischi attesi e loro mitigazione .....    | 4 |

## 1. Introduzione

Il presente documento costituisce la *Dichiarazione degli Impegni* del gruppo 22 di Ingegneria del Software, Coderius Group, candidato per lo sviluppo del capitolato [C1 – Automated EN18031<sub>G</sub> Compliance Verification](#), proposto dall'azienda **Bluewind S.r.l.**

L'obiettivo di questa stesura è definire l'impegno orario, la suddivisione dei ruoli, la descrizione di tali e il preventivo dei costi previsti fino alla consegna del prodotto finale.

## 2. Impegno orario e preventivo dei costi

Per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione delle tempistiche, il gruppo **Coderius** dichiara di dedicare un totale di **87 ore** di lavoro effettive per membro, per un totale di **522 ore** calcolate in base alla disponibilità dei membri e ad un'attenta analisi del documento di progetto.

| Membro                       | Impegno orario (h) |
|------------------------------|--------------------|
| Bronte Giovanni Angelo Marco | 87                 |
| Canavese Alberto             | 87                 |
| Hodja Edis                   | 87                 |
| Iadadi Ines                  | 87                 |
| Lorenzin Leonardo            | 87                 |
| Zonta Rocha Filippo          | 87                 |
| <b>Totale</b>                | <b>522</b>         |

Tabella 1: Divisione oraria tra i membri.

Tali ore verranno ripartite nei ruoli indicati nella *Tabella 2*

Dall'analisi effettuata sono risultati significativi i **ruoli** di *Analista*, *Verificatore* e *Progettista*, ai quali è stato assegnato un quantitativo di ore maggiore. Questo perchè il capitolato C1 richiede particolare attenzione all'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>, alla fase di progettazione e all'attività di verifica dei risultati continua.

| Ruolo                     | Costo Orario (€/h) | Ore per Membro | Ore Totali | Costo Totale (€) |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|
| Responsabile              | 30                 | 10             | 60         | 1800             |
| Amministratore            | 20                 | 9              | 54         | 1080             |
| Analista                  | 25                 | 12             | 72         | 1800             |
| Progettista               | 25                 | 16             | 96         | 2400             |
| Programmatore             | 15                 | 18             | 108        | 1620             |
| Verificatore              | 15                 | 22             | 132        | 1980             |
| <b>Totale Complessivo</b> |                    | <b>87</b>      | <b>522</b> | <b>10 680</b>    |

Tabella 2: Preventivo dei costi stimati ripartito per ruoli.

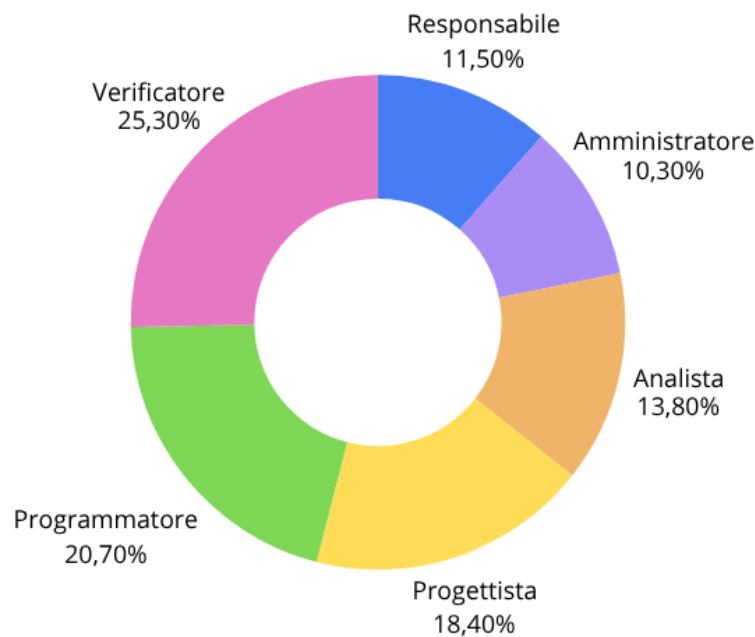


Figura 1: Grafo della distribuzione oraria.

### 3. Partizione dei ruoli

Di seguito vengono descritte le responsabilità associate a ciascun ruolo, i quali verranno ricoperti a rotazione dai membri del team.

#### 3.1. Descrizione dei ruoli

- **Responsabile**

Ha il compito di pianificare le scadenze, monitorare l'uso efficiente delle risorse e gestire eventuali rischi. Supervisiona l'andamento generale e autorizza il rilascio dei prodotti, sia parziali che finali. Il suo impegno è richiesto in modo continuativo per tutto l'arco di sviluppo del progetto. Tale ruolo deve essere sempre ricoperto da un solo membro del team.

- **Amministratore**

Assicura l'efficienza di procedure, strumenti e tecnologie a supporto del Way of Working del team. La sua presenza è costante per l'intero progetto.

- **Analista**

Svolge l'attività di analisi dei requisiti<sub>G</sub>, traducendo le esigenze espresse dal proponente<sub>G</sub> in requisiti<sub>G</sub> software concreti. Il suo contributo è di fondamentale importanza nelle fasi iniziali del progetto.

- **Progettista**

Attraverso attività di design e modellazione, stabilisce la struttura del software, definendo l'architettura dell'applicazione e la suddivisione tra i componenti Frontend<sub>G</sub> e Backend<sub>G</sub>. È la figura centrale durante la fase di progettazione.

- **Programmatore**

Si occupa della stesura del codice sorgente, implementando le decisioni stabilite dal *Progettista*. Il suo ruolo è centrale nella fase di implementazione e codifica.

- **Verificatore**

Progetta ed esegue attività di testing e validazione per assicurarsi che il software sviluppato non presenti difetti, rispetti le metriche di qualità e soddisfi i requisiti iniziali. La sua figura è essenziale durante la fase di implementazione e diventa predominante nelle fasi di rilascio e collaudo.

### 3.2. Distribuzione dei ruoli

La distribuzione delle ore è stata definita tenendo conto della natura del progetto e delle necessità di garantire un adeguato equilibrio tra attività tecniche e organizzative.

Al fine di favorire crescita e garantire una maggiore flessibilità operativa è stato adottato un principio di rotazione dei ruoli coerente con la metodologia *Agile*. Ciascun membro partecipa alle diverse attività progettuali ricoprendo i ruoli precedentemente definiti con la seguente logica:

- Ogni membro del team dovrà ricoprire ciascun ruolo almeno una volta nel ciclo di vita del progetto;
- La rotazione dei ruoli è pensata con cadenza bisettimanale ma può subire variazioni in caso di necessità;
- Ogni membro del team deve avere uno ed un solo ruolo assegnato;
- All'inizio di ciascuno sprint vengono individuate le attività da svolgere e stimate le ore necessarie per completarle. Il *Responsabile* si occupa di riequilibrare eventuali carichi di lavoro irregolari.
- Ciascun membro deve svolgere le ore previste per ogni ruolo senza eccedere il monte ore previsto (*Tabella 1*).

Questo approccio consente a tutti i componenti di acquisire una visione completa del progetto e di contribuire alle varie fasi, pur mantenendo una distribuzione del carico di lavoro coerente con i ruoli assegnati.

## 4. Termine del Progetto

Il gruppo Coderius prevede un impegno complessivo di **522 ore** di lavoro, corrispondenti ad un costo totale stimato di **10 680€**.

La conclusione e la consegna del progetto del capitolato **C1 – Automated EN18031<sub>G</sub> Compliance Verification**, proposto dall'azienda **Bluewind S.r.l.**, sono previste entro e non oltre il **18 settembre 2026**.

### 4.1. Rischi attesi e loro mitigazione

#### 4.1.1. Ritardi nello sviluppo

**Conseguenze:** Possibile slittamento delle scadenze, accumulo di attività e riduzione della qualità del prodotto finale.

**Mitigazione:** *Pianificazione flessibile* delle attività, suddivisione chiara dei *task* e monitoraggio periodico dello stato di avanzamento.

#### 4.1.2. Difficoltà con tecnologie

**Conseguenze:** Rallentamenti nello sviluppo e aumento del tempo necessario per l'implementazione di alcune funzionalità.

**Mitigazione:** Approfondimento preliminare delle tecnologie, *condivisione* delle conoscenze tra i membri del gruppo tramite i canali di comunicazione e approccio collaborativo nella risoluzione dei problemi. Sostegno fornito dall'azienda, come espresso nel [verbale esterno](#).

#### 4.1.3. Comprensione della norma EN18031<sub>G</sub>

**Conseguenze:** Incoerenze nella documentazione, difficoltà nella validazione dei requisiti<sub>G</sub> posti dal proponente<sub>G</sub> e possibile non conformità agli obiettivi del progetto, in particolare nell'interpretazione e applicazione dei meccanismi di *Access Control (ACM)* e *Authentication (AUM)* previsti dalla norma.

**Mitigazione:** Verifica continua della documentazione, attenzione alle specifiche richieste e ruolo attivo del *Verificatore* nel controllo della qualità e delle conformità del lavoro svolto.
