Dichiarazione degli impegni

Gruppo Coderius

coderius01@gmail.com

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.2	2026/03/22	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Integrazione della sezione scadenze e rischi del progetto
0.1.1	2026/03/21	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Analisi impegni orari e distribuzione dei ruoli
0.1.0	2026/03/20	Ines Iadadi	Filippo Zonta Rocha	Stesura iniziale del documento

Indice

1. Introduzione 1

2. Impegno orario e preventivo dei costi 1

3. Partizione dei ruoli 2
   3.1. Descrizione dei ruoli 2
   3.2. Distribuzione dei ruoli 3

4. Termine del Progetto 4
   4.1. Rischi attesi e loro mitigazione 4

1. Introduzione

Il presente documento costituisce la *Dichiarazione degli Impegni* del gruppo 22 di Ingegneria del Software, Coderius Group, candidato per lo sviluppo del capitolato **C1 – Automated EN18031$_G$ Compliance Verification**, proposto dall'azienda **Bluewind S.r.l.**.

L'obiettivo di questa stesura è definire l'impegno orario, la suddivisione dei ruoli, la descrizione di tali e il preventivo dei costi previsti fino alla consegna del prodotto finale.

2. Impegno orario e preventivo dei costi

Per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione delle tempistiche, il gruppo **Coderius** dichiara di dedicare un totale di **87 ore** di lavoro effettive per membro, per un totale di **522 ore** calcolate in base alla disponibilità dei membri e ad un'attenta analisi del documento di progetto.

Membro	**Impegno orario (h)**
Bronte Giovanni Angelo Marco	87
Canavese Alberto	87
Hodja Edis	87
Iadadi Ines	87
Lorenzin Leonardo	87
Zonta Rocha Filippo	87
Totale	522

Tabella 1: Divisione oraria tra i membri.

Tali ore verranno ripartite nei ruoli indicati nella *Tabella 2*
Dall'analisi effettuata sono risultati significativi i **ruoli** di *Analista*, *Verificatore* e *Progettista*, ai quali è stato assegnato un quantitativo di ore maggiore. Questo perchè il capitolato C1 richiede particolare attenzione all'Analisi dei Requisiti, alla fase di progettazione e all'attività di verifica dei risultati continua.

Ruolo	**Costo Orario (€/h)**	**Ore per Membro**	**Ore Totali**	**Costo Totale (€)**
Responsabile	30	10	60	1800
Amministratore	20	9	54	1080
Analista	25	12	72	1800
Progettista	25	16	96	2400
Programmatore	15	18	108	1620
Verificatore	15	22	132	1980
Totale Complessivo		**87**	**522**	**10 680**

Tabella 2: Preventivo dei costi stimati ripartito per ruoli.

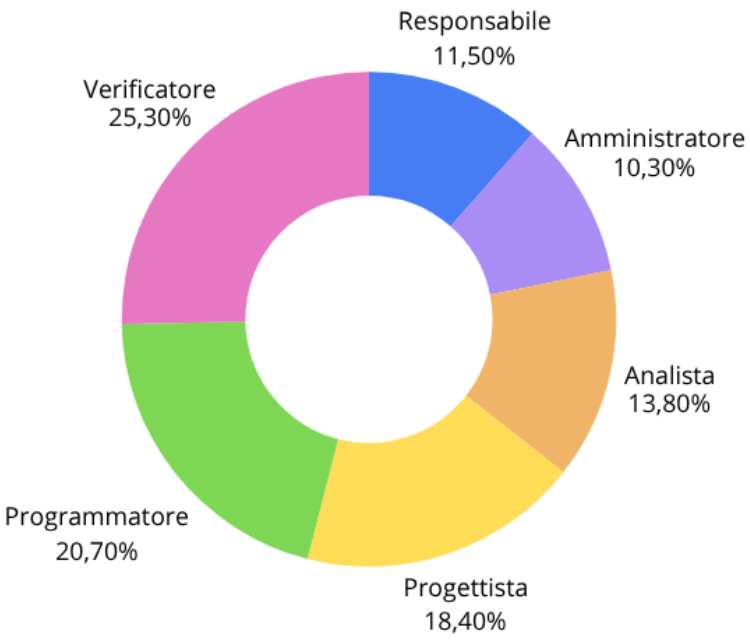

Figura 1: Grafo della distribuzione oraria.

3. Partizione dei ruoli

Di seguito vengono descritte le responsabilità associate a ciascun ruolo, i quali verranno ricoperti a rotazione dai membri del team.

3.1. Descrizione dei ruoli

- **Responsabile**
  Ha il compito di pianificare le scadenze, monitorare l'uso efficiente delle risorse e gestire eventuali rischi. Supervisiona l'andamento generale e autorizza il rilascio dei prodotti, sia parziali che finali. Il suo impegno è richiesto in modo continuativo per tutto l'arco di sviluppo del progetto. Tale ruolo deve essere sempre ricoperto da un solo membro del team.

- **Amministratore**
  Assicura l'efficienza di procedure, strumenti e tecnologie a supporto del Way of Working del team. La sua presenza è costante per l'intero progetto.

- **Analista**
  Svolge l'attività di analisi dei requisiti, traducendo le esigenze espresse dal proponente in requisiti software concreti. Il suo contributo è di fondamentale importanza nelle fasi iniziali del progetto.

- **Progettista**
  Attraverso attività di design e modellazione, stabilisce la struttura del software, definendo l'architettura dell'applicazione e la suddivisione tra i componenti Frontend e Backend. È la figura centrale durante la fase di progettazione.

- **Programmatore**
  Si occupa della stesura del codice sorgente, implementando le decisioni stabilite dal *Progettista*. Il suo ruolo è centrale nella fase di implementazione e codifica.
- **Verificatore**
  Progetta ed esegue attività di testing e validazione per assicurarsi che il software sviluppato non presenti difetti, rispetti le metriche di qualità e soddisfi i requisiti iniziali. La sua figura è essenziale durante la fase di implementazione e diventa predominante nelle fasi di rilascio e collaudo.

3.2. Distribuzione dei ruoli

La distribuzione delle ore è stata definita tenendo conto della natura del progetto e delle necessità di garantire un adeguato equilibrio tra attività tecniche e organizzative.
Al fine di favorire crescita e garantire una maggiore flessibilità operativa è stato adottato un principio di rotazione dei ruoli coerente con la metodologia *Agile*. Ciascun membro partecipa alle diverse attività progettuali ricoprendo i ruoli precedentemente definiti con la seguente logica:

- Ogni membro del team dovrà ricoprire ciascun ruolo almeno una volta nel ciclo di vita del progetto;
- La rotazione dei ruoli è pensata con cadenza bisettimanale ma può subire variazioni in caso di necessità;
- Ogni membro del team deve avere uno ed un solo ruolo assegnato;
- All'inizio di ciascuno sprint vengono individuate le attività da svolgere e stimate le ore necessarie per completarle. Il *Responsabile* si occupa di riequilibrare eventuali carichi di lavoro irregolari.
- Ciascun membro deve svolgere le ore previste per ogni ruolo senza eccedere il monte ore previsto (*Tabella 1*).

Questo approccio consente a tutti i componenti di acquisire una visione completa del progetto e di contribuire alle varie fasi, pur mantenendo una distribuzione del carico di lavoro coerente con i ruoli assegnati.

4. Termine del Progetto

Il gruppo **Coderius** prevede un impegno complessivo di **522 ore** di lavoro, corrispondenti ad un costo totale stimato di **10 680€**.
La conclusione e la consegna del progetto del capitolato **C1 – Automated EN18031**$_G$ **Compliance Verification**, proposto dall'azienda **Bluewind S.r.l.**, sono previste entro e non oltre il **18 settembre 2026**.

4.1. Rischi attesi e loro mitigazione

4.1.1. Ritardi nello sviluppo

Conseguenze: Possibile slittamento delle scadenze, accumulo di attività e riduzione della qualità del prodotto finale.
Mitigazione: *Pianificazione flessibile* delle attività, suddivisione chiara dei *task* e monitoraggio periodico dello stato di avanzamento.

4.1.2. Difficoltà con tecnologie

Conseguenze: Rallentamenti nello sviluppo e aumento del tempo necessario per l'implementazione di alcune funzionalità.
Mitigazione: Approfondimento preliminare delle tecnologie, *condivisione* delle conoscenze tra i membri del gruppo tramite i canali di comunicazione e approccio collaborativo nella risoluzione dei problemi. Sostegno fornito dall'azienda, come espresso nel verbale esterno.

4.1.3. Comprensione della norma EN18031$_G$

Conseguenze: Incoerenze nella documentazione, difficoltà nella validazione dei requisiti posti dal proponente e possibile non conformità agli obiettivi del progetto, in particolare nell'interpretazione e applicazione dei meccanismi di *Access Control (ACM)* e *Authentication (AUM)* previsti dalla norma.
Mitigazione: Verifica continua della documentazione, attenzione alle specifiche richieste e ruolo attivo del *Verificatore* nel controllo della qualità e delle conformità del lavoro svolto.
