# Dichiarazione degli impegni

**Gruppo Coderius**

coderius01@gmail.com

# Tabella di versionamento

| Versione | Data | Autore | Verificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 0.1.2 | 2026/03/22 | Edis Hodja | Filippo Zonta Rocha | Integrazione della sezione scadenze e rischi del progetto |
| 0.1.1 | 2026/03/21 | Edis Hodja | Filippo Zonta Rocha | Analisi impegni orari e distribuzione dei ruoli |
| 0.1.0 | 2026/03/20 | Ines Iadadi | Filippo Zonta Rocha | Stesura iniziale del documento |

# Indice

1. Introduzione ..... 1

2. Impegno orario e preventivo dei costi ..... 1

3. Partizione dei ruoli ..... 2
   3.1. Descrizione dei ruoli ..... 2
   3.2. Distribuzione dei ruoli ..... 3

4. Termine del Progetto ..... 4
   4.1. Rischi attesi e loro mitigazione ..... 4

# 1. Introduzione

Il presente documento costituisce la *Dichiarazione degli Impegni* del gruppo 22 di Ingegneria del Software, Coderius Group, candidato per lo sviluppo del capitolato **C1 – Automated EN18031 Compliance Verification**, proposto dall'azienda **Bluewind S.r.l.**.

L'obiettivo di questa stesura è definire l'impegno orario, la suddivisione dei ruoli, la descrizione di tali e il preventivo dei costi previsti fino alla consegna del prodotto finale.

# 2. Impegno orario e preventivo dei costi

Per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione delle tempistiche, il gruppo **Coderius** dichiara di dedicare un totale di **93 ore** di lavoro effettive per membro, per un totale di **558 ore** calcolate in base alla disponibilità dei membri e ad un'attenta analisi del documento di progetto.

| **Membro** | **Impegno orario (h)** |
|---|---|
| Bronte Giovanni Angelo Marco | 93 |
| Canavese Alberto | 93 |
| Hodja Edis | 93 |
| Iadadi Ines | 93 |
| Lorenzin Leonardo | 93 |
| Zonta Rocha Filippo | 93 |
| **Totale** | 558 |

Tabella 1: Divisione oraria tra i membri.

Tali ore verranno ripartite nei ruoli indicati nella *Tabella 2*
Dall'analisi effettuata sono risultati significativi i **ruoli** di *Analista*, *Verificatore* e *Progettista*, ai quali è stato assegnato un quantitativo di ore maggiore. Questo perchè il capitolato C1 richiede particolare attenzione all'Analisi dei Requisiti, alla fase di progettazione e all'attività di verifica dei risultati continua.

| **Ruolo** | **Costo Orario (€/h)** | **Ore per Membro** | **Ore Totali** | **Costo Totale (€)** |
|---|---|---|---|---|
| Responsabile | 30 | 10 | 60 | 1800 |
| Amministratore | 20 | 9 | 54 | 1080 |
| Analista | 25 | 14 | 84 | 1800 |
| Progettista | 25 | 20 | 120 | 2400 |
| Programmatore | 15 | 18 | 108 | 1620 |
| Verificatore | 15 | 22 | 132 | 1980 |
| **Totale Complessivo** | | **93** | **558** | **10 680** |

Tabella 2: Preventivo dei costi stimati ripartito per ruoli.

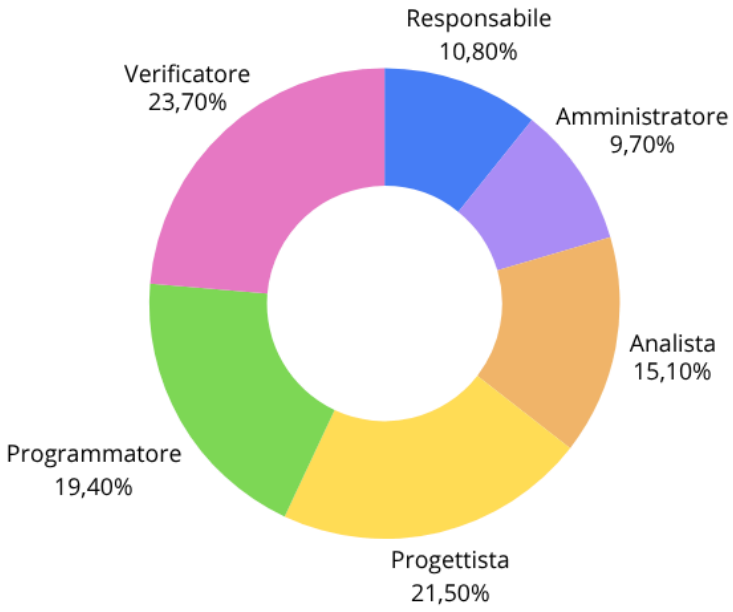


Figura 1: Grafo della distribuzione oraria.

# 3. Partizione dei ruoli

Di seguito vengono descritte le responsabilità associate a ciascun ruolo, i quali verranno ricoperti a rotazione dai membri del team.

## 3.1. Descrizione dei ruoli

- **Responsabile**
  Ha il compito di pianificare le scadenze, monitorare l'uso efficiente delle risorse e gestire eventuali rischi. Supervisiona l'andamento generale e autorizza il rilascio dei prodotti, sia parziali che finali. Il suo impegno è richiesto in modo continuativo per tutto l'arco di sviluppo del progetto. Tale ruolo deve essere sempre ricoperto da un solo membro del team.

- **Amministratore**
  Assicura l'efficienza di procedure, strumenti e tecnologie a supporto del Way of Working del team. La sua presenza è costante per l'intero progetto.

- **Analista**
  Svolge l'attività di analisi dei requisiti, traducendo le esigenze espresse dal proponente in requisiti software concreti. Il suo contributo è di fondamentale importanza nelle fasi iniziali del progetto.

- **Progettista**
  Attraverso attività di design e modellazione, stabilisce la struttura del software, definendo l'architettura dell'applicazione e la suddivisione tra i componenti Frontend e Backend. È la figura centrale durante la fase di progettazione.

- **Programmatore**
  Si occupa della stesura del codice sorgente, implementando le decisioni stabilite dal *Progettista*. Il suo ruolo è centrale nella fase di implementazione e codifica.
- **Verificatore**
  Progetta ed esegue attività di testing e validazione per assicurarsi che il software sviluppato non presenti difetti, rispetti le metriche di qualità e soddisfi i requisiti iniziali. La sua figura è essenziale durante la fase di implementazione e diventa predominante nelle fasi di rilascio e collaudo.

## 3.2. Distribuzione dei ruoli

La distribuzione delle ore è stata definita tenendo conto della natura del progetto e delle necessità di garantire un adeguato equilibrio tra attività tecniche e organizzative.
Al fine di favorire crescita e garantire una maggiore flessibilità operativa è stato adottato un principio di rotazione dei ruoli coerente con la metodologia *Agile*. Ciascun membro partecipa alle diverse attività progettuali ricoprendo i ruoli precedentemente definiti con la seguente logica:

- Ogni membro del team dovrà ricoprire ciascun ruolo almeno una volta nel ciclo di vita del progetto;
- La rotazione dei ruoli è pensata con cadenza bisettimanale ma può subire variazioni in caso di necessità;
- Ogni membro del team deve avere uno ed un solo ruolo assegnato;
- All'inizio di ciascuno sprint vengono individuate le attività da svolgere e stimate le ore necessarie per completarle. Il *Responsabile* si occupa di riequilibrare eventuali carichi di lavoro irregolari.
- Ciascun membro deve svolgere le ore previste per ogni ruolo senza eccedere il monte ore previsto (*Tabella 1*).

Questo approccio consente a tutti i componenti di acquisire una visione completa del progetto e di contribuire alle varie fasi, pur mantenendo una distribuzione del carico di lavoro coerente con i ruoli assegnati.

# 4. Termine del Progetto

Il gruppo **Coderius** prevede un impegno complessivo di **558 ore** di lavoro, corrispondenti ad un costo totale stimato di **10 680€**.
La conclusione e la consegna del progetto del capitolato **C1 – Automated EN18031 Compliance Verification**, proposto dall'azienda **Bluewind S.r.l.**, sono previste entro e non oltre il **18 settembre 2026**.

## 4.1. Rischi attesi e loro mitigazione

### 4.1.1. Ritardi nello sviluppo

**Conseguenze:** Possibile slittamento delle scadenze, accumulo di attività e riduzione della qualità del prodotto finale.
**Mitigazione:** *Pianificazione flessibile* delle attività, suddivisione chiara dei *task* e monitoraggio periodico dello stato di avanzamento.

### 4.1.2. Difficoltà con tecnologie

**Conseguenze:** Rallentamenti nello sviluppo e aumento del tempo necessario per l'implementazione di alcune funzionalità.
**Mitigazione:** Approfondimento preliminare delle tecnologie, *condivisione* delle conoscenze tra i membri del gruppo tramite i canali di comunicazione e approccio collaborativo nella risoluzione dei problemi. Sostegno fornito dall'azienda, come espresso nel verbale esterno.

### 4.1.3. Comprensione della norma EN18031

**Conseguenze:** Incoerenze nella documentazione, difficoltà nella validazione dei requisiti posti dal proponente e possibile non conformità agli obiettivi del progetto, in particolare nell'interpretazione e applicazione dei meccanismi di *Access Control (ACM)* e *Authentication (AUM)* previsti dalla norma.
**Mitigazione:** Verifica continua della documentazione, attenzione alle specifiche richieste e ruolo attivo del *Verificatore* nel controllo della qualità e delle conformità del lavoro svolto.
